



## Bau-Newsletter

Ausgabe Juni 2025

### Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, Angehörige, Besucher und Mitarbeitende,

wir möchten Sie gerne über den aktuellen Fortschritt der Baumaßnahmen an unseren Klinikstandorten informieren. In Naila befinden sich die Arbeiten in der finalen Phase, sodass ein baldiger Umzug der Notaufnahme möglich ist. In Münchberg sind derzeit bis zu 80 Fachkräfte vor Ort und mit den umfangreichen Bauarbeiten beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie nachfolgend.

#### Sanierung und Erweiterung der Klinik Münchberg

Die Trockenbauwände werden weiterhin nach und nach geschlossen. Die Ausführung erfolgt gemeinsam mit den entsprechenden Firmen, die Regelungs- und Messtechnik, Strom und Medienversorgungen einbringen.

Auf den Dachflächen erfolgen derzeit die Begrünung, die Bekiesung sowie vorbereitende Maßnahmen für die Installation der PV-Anlage. Auf dem Dach von Bauabschnitt 2 (BA2), der künftig die neue Verwaltung beherbergen wird, sind diese Arbeiten bereits abgeschlossen. In den oberen Etagen des BA2 sind zudem die Bodenbelagsarbeiten beendet, es wurden Türen montiert und Fliesen in den Sanitärbereichen verlegt. Derzeit erfolgen noch Malerarbeiten.



PV-Anlagen und Begrünung auf dem Dach von BA2

Der Estrich im 1. Obergeschoss von Bauabschnitt 1 – OP-Säle und Intensivstation – wurde bereits eingebracht. Die weiteren Arbeiten im Erdgeschoss sind für Juli terminiert.

Der Hauptkabelzug für die Starkstromversorgung ist abgeschlossen. Insgesamt wurden bereits rund 150 Kilometer an Stromleitungen verlegt.

In den Technikzentralen im 2. Obergeschoss und im Keller laufen weiterhin aufwändige Installationsarbeiten. Zudem werden die Leitungen (Lüftung, Wasser etc.) gedämmt.




Dämmarbeiten in den Technikzentralen

Im Untergeschoss haben die Putzarbeiten begonnen und es werden die letzten Fenster montiert. Auch im Verbindungsgang zum Bestandsgebäude erfolgt bis Ende Juni der Einbau der Fenster sowie der Abschluss der verbleibenden Blecharbeiten.

Weitere kleinere Mauer- und Betonarbeiten werden zudem durchgeführt. So entstand u.a. ein neuer Fluchtweg aus der bestehenden Cafeteria.

In den Treppenhäusern werden nach und nach die Geländer eingebaut. Ab Juli beginnt der Einbau der Aufzüge.

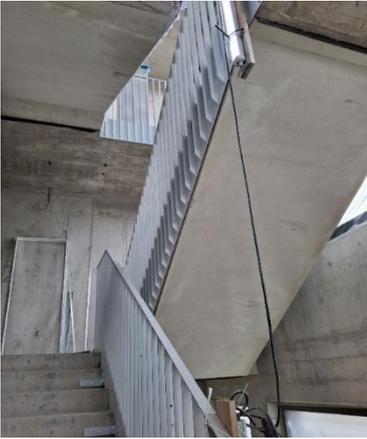

Einbau der Treppengeländer

Auch der Bau des neuen Foyers schreitet sehr gut voran. Die Bodenplatte wurde bereits betonierte und alle weiteren Betonarbeiten sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein. Ziel ist es, den Rohbau noch vor Beginn der Wintermonate wetterdicht fertigzustellen.



Bodenplatte des neuen Foyers

(Autor: Johannes Dimmling, M.Sc. Bauingenieur, Landratsamt Hof)

## Sanierung und Erweiterung der Klinik Naila

In der Notaufnahme ist der Ausbau bereits so weit fortgeschritten, dass die zukünftige Nutzung der einzelnen Räume erkennbar ist. Die medizintechnische Ausstattung, einschließlich der Deckenversorgungseinheiten und Untersuchungsleuchten, wurde bereits installiert.



Untersuchungsraum in der neuen Notaufnahme



Neuer Empfangstresen

Zurzeit werden Rauchmelder installiert, Rufanlagen in Betrieb genommen sowie Handtuch- und Desinfektionsmittelspender angebracht. Die Beschilderung und das Mobiliar werden in Kürze geliefert.

Im Außenbereich wird der Bau des Windfangs für die Liegendkrankenfahrt vorangetrieben.



Arbeiten am Windfang für Liegendkranke

Weiterhin wird die Zufahrt für die Rettungswagen neu asphaltiert. Am Rand der Einfahrt entstehen Stellplätze für den Notarzt und für Kurzzeitparker.

(Autorin: Sabine Friedrich-Taubald, Dipl.-Ing. (FH) Architektur, Technischer Dienst Kliniken Hochfranken)

---

**Ihre Ansprechpartnerinnen für die Öffentlichkeitsarbeit:** Sabrina Hannemann (09251 872-163) und Anja Müller (09251 872-164)

[oeffentlichkeitsarbeit@kliniken-hochfranken.de](mailto:oeffentlichkeitsarbeit@kliniken-hochfranken.de)
