



Bau-Newsletter

Ausgabe Juli 2024

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, Angehörige, Besucher und Mitarbeitende,

die Bauarbeiten an unseren Kliniken in Münchenberg und Naila kommen weiterhin gut voran. Unser Newsletter hält Sie über die neuesten Ereignisse und Entwicklungen auf dem Laufenden.

Sanierung und Erweiterung der Klinik Münchenberg

Der neue Wirtschaftshof wurde in Betrieb genommen. Im Bereich des alten Wirtschaftshofs finden derzeit Fundamentarbeiten für den neuen Verbindungsgang vom Neubau in den Bestandsbau statt.



Fundamentarbeiten für den neuen Verbindungsgang

Die Zufahrt zum alten Wirtschaftshof wurde gesperrt. Dort werden aktuell die Träger des Verbaus gezogen – zuvor waren hier Hinterfüllarbeiten notwendig.



Abgeschlossene Hinterfüllarbeiten mit den noch zu ziehenden Verbau-Trägern

Im Inneren des Gebäudes werden Rohrleitungs-montagen im Bereich Heizung und Sanitär durchgeführt. Die Trockenbaufirma baut derzeit die Durchblickfenster im Bereich der Intensivstation ein. Leider konnten die Trockenbauwände im 1. und 2. Bauabschnitt noch nicht vollständig verschlossen werden, da noch Elektroarbeiten ausgeführt werden müssen. Ziel ist es im Juli großflächig mit dem Verschluss der Trockenbauwände zu starten. Dies ist die notwendige Vorleistung für die Estricharbeiten. Bei den Ausbauarbeiten werden v.a. Installationen für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) sowie Fernmeldetechnik ausgeführt.

Im Bereich der Technikzentrale auf dem Dach des Funktionsgebäudes wurde der Estrichboden verlegt und die Beschichtung aufgetragen. Im Anschluss daran wurden die Lüftungsgeräte in die Zentrale eingebracht. Die Lamellenfassade des Technikgeschosses wurde bis auf einen kleinen Bereich, an dem das Gerüst befestigt ist, fertiggestellt. Hierzu gab es bereits eine Zustandsfeststellung.



Technikzentrale mit Estrichboden und Lüftungsgeräten

Der Fensterbauer montiert derzeit die Brüstungselemente der Pfosten-Riegel-Fassade im Bereich Liegendkrankenvorfahrt. Die auf der Süd- und Westseite befindliche Fassadenbefahranlage wurde abgenommen und an die Klinik übergeben. Im Bereich der Fassade wurden in Teilen bereits die Betonfertigteile montiert. Wenn die noch fehlenden Fenster eingebaut wurden, werden die Arbeiten der Betonfertigteile-Fassade wieder aufgenommen. Dies ist für Ende September 2024 geplant.




Begonnene Arbeiten an der Betonfertigteile-Fassade

Die nächsten Ausschreibungen, die im Sommer 2024 auf den Markt gehen, sind Außenanlagen gesamt, Festeinbauten, Rammschutz sowie Küchenausstattung.

(Autorin: Andrea Müller, Dipl.-Ing. (FH) Architektin, Landratsamt Hof)

Sanierung und Erweiterung der Klinik Naila

Mit der Fertigstellung des Bauabschnitts 2A im Januar 2024 konnten die Ambulanzen, das Labor und die Endoskopie in die neuen Räumlichkeiten umziehen. Daraufhin wurde umgehend mit Bauabschnitt 2B – den Sanierungsarbeiten zur neuen Notaufnahme im Erdgeschoß – begonnen.

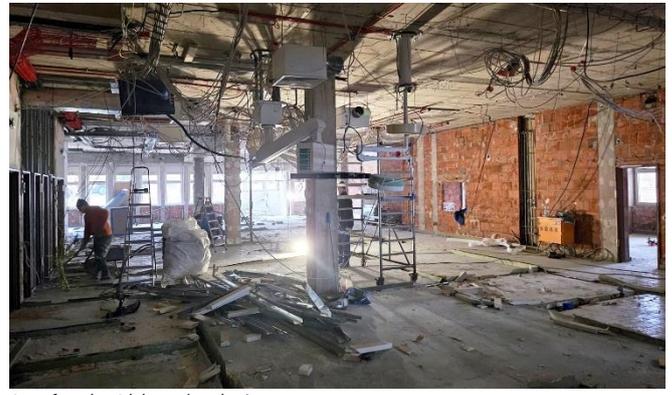

Laufende Abbrucharbeiten

Hinter der Staubwand rund um die Radiologie wurden die Abbrucharbeiten inzwischen zum größten Teil beendet. Die Abdichtung der Bodenplatte und die statisch erforderlichen Einbauten sind erfolgt sowie die Fenster getauscht. Seit Mitte Juli laufen die Trockenbauarbeiten. Parallel dazu wird an Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallation gearbeitet.



Fundamentaushub (links) für die dann eingesetzte Stahlstütze (rechts)

Bis Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten beendet sein, sodass im nächsten Jahr die Möblierung und medizinische Ausstattung eingebracht werden können. Der Umzug ist für das 2. Quartal 2025 geplant.

(Autorin: Sabine Friedrich-Taubald, Dipl.-Ing. (FH) Architektur, Technischer Dienst Kliniken Hochfranken)

Ihre Ansprechpartnerinnen für die Öffentlichkeitsarbeit: Sabrina Hannemann (09251 872-163) und Anja Müller (09251 872-164)

oeffentlichkeitsarbeit@kliniken-hochfranken.de
